

## 12. 대현산 배수지공원 모노레일 운영

관리번호	1-12	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	사업예산	5,084백만원
사업주체	중구/서울시/국가	신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진		
작성 자	도로시설과장 : 어원철 ☎8252   도로계획팀장 : 기효상 ☎6101   담당 : 김은진 ☎6103						

신당동, 동화동 일대 대현산배수지공원을 이용하는 보행약자 및 지역주민을 위한 모노레일을 설치하여 안전하고 쾌적한 보행환경 제공

### ☐ 정책개요

- 사업명 : 대현산배수지공원 접근로 개선사업
- 사업기간 : 2020.12. ~ 2024.02.
- 위치 : 대현산배수지공원 진입계단(신당동 837-14일원)
- 규모 : 모노레일(15인승, 선로 110m) 및 승강장 3개소

최대정원	주행속도	운전방식	소요시간
15인승(좌석6, 입석9)	최대 3.6km/h	자동무인운전 및 버튼	왕복 약 6~7분

- 총사업비 : 5,084백만원(시비 5,066, 구비 18)

### ☐ 추진실적

- 2022.09. : 공사계약 및 착공
- 2023.01. ~ 02. : 지장물(계단, 캐노피 등) 철거 및 지장수목 제거
- 2023.11.24. : 모노레일 운영 및 유지관리 계획 수립
- 2024.02.15. : 모노레일 개통
- 2024.03.14. ~ : 모노레일 안전지킴이 운영
  - 기간제근무자 활용 모노레일 정상운행 모니터링, 승하차 안전관리 등
- 2024.03.20. ~ : 매월 셋째주 수요일 모노레일 정기점검의 날
  - 안전한 모노레일 운영을 위해 매월 1회 정기점검 실시(모노레일 미운영)
- 2024.06. ~ 08. : 하절기 한시적 연장운영 실시
  - 하절기 한시적으로 모노레일 운영시간 연장(2시간)하여 주민 이동편의 제공

## ☐ 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 모노레일 설치 및 개통	목표	0	100				100
	실적	0	95	5			

## ☐ 연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구 분		계	2022	2023	2024	2025	2026
확 보 액	소계	5,084	4,766	300	18		
	시비	5,066	4,766	300			
	구비	18			18		
집 행 액	소계	5,084	2,166	2,600	318		
	시	5,066	2,166	2,600	300		
	구비	18			18		


## ☐ 향후계획

- 2025.01. ~ : 모노레일 운영

## ☐ 홍보계획

- 보도자료 배포, 홈페이지 및 중구광장 게시, 미디어보드 활용 홍보
- 인근 아파트 게시판 홍보물 부착, 주민 밴드 및 단체 카톡방 활용 홍보

## 위 치 도

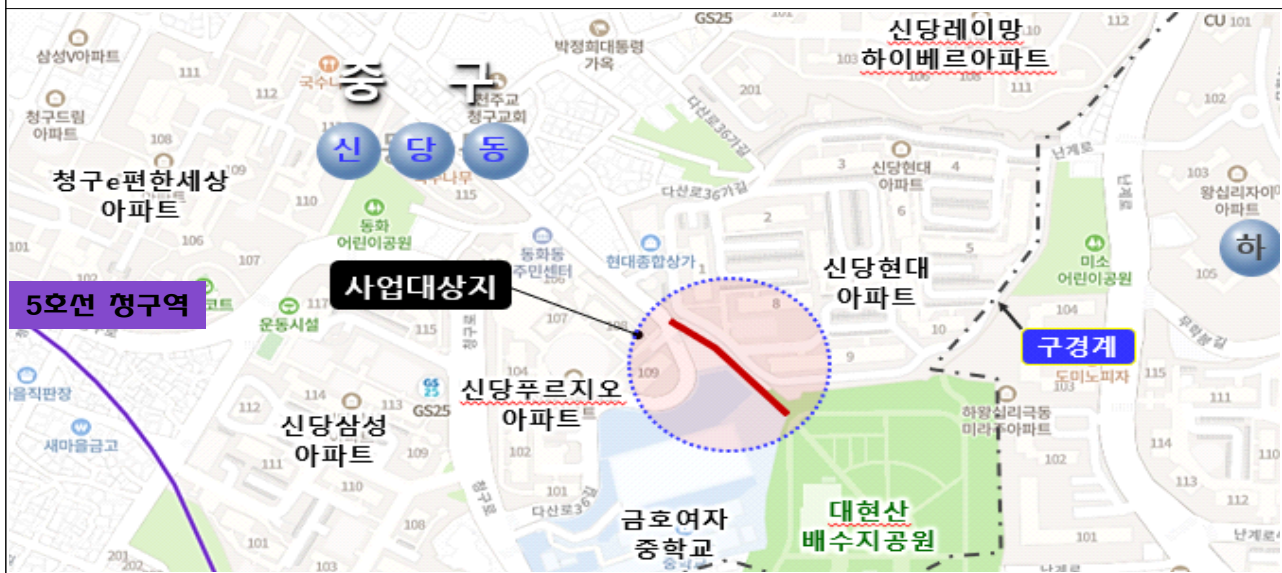

## 현황사진



## 현황사진

