

12. 대현산 배수지공원 모노레일 운영

관리번호	1-12	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	사업예산	5,066백만원
사업주체	중구/서울시/국가	신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/ 추진중 /일부추진		
작성 자	도로시설과장 : 어원철 ☎8252		도로계획팀장 : 기효상 ☎6101		담당 : 김은진 ☎6104		

신당동, 동화동 일대 주거지역에 공원을 이용하는 보행약자 및 지역 주민의 이용편의를 위한 이동편의시설(모노레일)을 설치하여 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공

□ 정책개요

- 사업명 : 대현산배수지공원 접근로 개선사업
- 사업기간 : 2020.12. ~ 2024.01.
- 위치 : 대현산배수지공원 진입계단(신당동 837-14외 2필지)
- 규모 : 모노레일(L=110m) 및 승강장 3개소 설치

최대정원	주행속도	운전방식	운행시간
15인승(좌석6, 입석9)	최대 3.6km/h	자동무인운전 및 버튼	왕복 약 6~7분

- 총사업비 : 5,066백만원

□ 추진실적

- 2022.09. : 공사계약 및 착공
- 2022.10. ~ 12. : 유관기관 및 학교, 인근주민 사전안내 및 공사협의
- 2023.01. ~ 02. : 지장물(계단, 캐노피 등) 철거 및 지장수목 제거
- 2023.11.24. : 모노레일 운영 및 유지관리 계획 수립(구청장방침)
- 2023.03. ~ 12. : 모노레일 시험운행 완료, 조경공사 완료, 계단 데크 설치중



공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 모노레일 설치 및 개통	목표	0	100				95
	실적	0	95				

연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구분		계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계	5,066	4,766	300			
	시비	5,066	4,766	300			
집행액	소계	5,066	2,166	2,600	300		
	시비	5,066	2,166	2,600	300		


향후계획

- 2024.01.22. ~ 24. : 모노레일 준공검사(한국교통안전공단)
- 2024. 2월초 : 모노레일 개통(예정)

홍보계획

- 보도자료 배포, 홈페이지 및 중구광장 게시, 미디어보드 활용 홍보
- 인근 아파트 게시판 홍보물 부착, 현수막 게시, 주민 밴드 및 단체 카톡방 활용 홍보

위치도

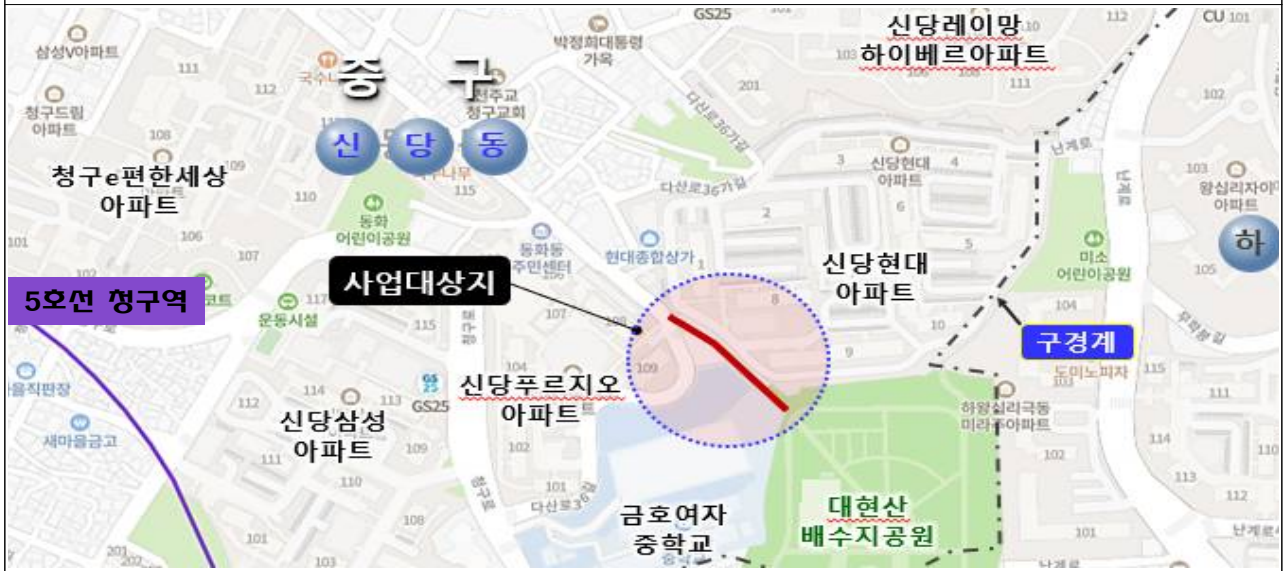

현황사진



공사계획 도면



조감도

