

16. 대현산 배수지공원 이용 활성화

관리번호	5-16	사업구분	임기내	사업시기	단기	사업예산	11,950백만원
사업주체	중구		신규여부	신규	이행단계	완료/완료(지속)/ 추진중 /일부추진	
작성 자	공원녹지과장 : 홍순철 ☎8244		도시숲팀장 : 조영곤 ☎5871		담당 : 김준성 ☎5872		

노약자, 장애인, 임산부 등 **보행약자뿐만 아니라 남녀노소** 누구나 **무학봉공원에서 응봉공원을 거쳐 남산까지** 편하게 걸을수 있는 **걸고싶은 무장애 친화 숲길을 조성하여 산림문화·휴양서비스를 제공하고자 함.**

사업개요

- 위 치 : 무학봉공원 ~ 응봉공원 ~ 남산
- 규 모 : 5.52km
 - **안내체계 정비 구간** 무학봉공원 ~ 응봉공원 입구(1.72km)
 - **무장애 친화숲길 구간** 응봉공원 입구 ~ 반얀트리호텔(3.42km)
 - **남산 연결로 구간** 반얀트리호텔 ~ 남산(0.38km)
- 기 간 : 2022. 5. ~ 2025. 12.

기간	사업명	위치	규모(km)	내용	소요예산(백만원)	비고
3단계 공사 추진			5.52		11,950	
기본 및 실시설계용역			-	계획안 구상 및 설계	200	
2023 (1단계)	응봉 친화숲길	무학봉 ~매봉산	3.39	- 안내체계 정비 - 무장애 친화숲길 조성 (흙길, 데크길)	2,100	
2023 (2단계)	응봉 무장애나눔길	매봉산 ~버티고개	1.02	- 무장애 친화숲길 조성 (데크길)	2,200	
2024 (3단계)	매봉산-남산 무장애나눔길	버티고개 ~반얀트리	0.73	- 무장애 친화숲길 조성 (데크길)	1,450	
2025 (사업연계)	반얀트리-남산 녹지연결로 조성	반얀트리 ~ 남산	0.38	- 녹지연결로(생태육교) 조성	6,000	

※ **시장연생태과 반얀트리-남산 녹지연결로 조성 추진토록 지속협의를중**

- 내 용 : 무장애 데크로드 조성, 산책로 정비, 남산연결로 설치 등
- 소요예산 : 11,950백만원 (무장애 친화 숲길 조성 59.5억원, 남산연결로 60억원)
 - ※ 무장애 친화 숲길 조성비 59.5억원 확보(국비 9.6억원, 시비 6.4억원, 특교세 16억원, 특교금 17.5억원)

추진실적

- 2022. 5. 12. : 사업방침 수립 (국장 전결)
- 2022. 7. 12. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2022. 11. 4. : 기본 및 실시설계 용역보고회 개최 (구청장 보고)
- 2022. 11. 10. : 사업방침 재수립 (구청장 전결)
- 2023. 2. 17. ~ 3. 15.: 유관기관 협의 (성동구, 용산구, 중부공원센터)
- 2023. 3. 8. ~ 3. 21.: 주민설명회 개최 (2회) 및 주민의견 수렴
- 2023. 3. 30. : 區투자심사 ⇒ 적정
- 2023. 4. 13. : 市건설기술심의 (설계심의) ⇒ 조건부 통과
- 2023. 4. 20. : 남산연결로 조성 요청 (市자연생태과, 중부공원여가센터)
- 2023. 4. 28. : 24년도 市시민참여예산 신청 (14.5억원)
- 2023. 5. 4. : 남산연결로 관련 서울시장-중구청장 면담
→ 조건부 승인 : 폭10m 이상 녹지연결로 조속추진
- 2023. 5. 31. : 설계용역 (1·2·3단계) 완수 및 계약심사
- 2023. 6. 15. ~ 8. 16.: 1·2단계 (무학봉~매봉산~버티고개) 공사 발주 및 착공


○ 주민 참여(소통) 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송보도	그 외 소통방안
2	1	-	-	2 (산책로 내 사업안내)


- 약수하이츠, 남산타운아파트 주민설명회 개최: 2023. 3. 9. / 3.21.
 - ▶ 공원-주택가 기존 연결계단 정비(약수하이츠), 기존 흙길 보존(남산타운)
- 무학봉공원, 응봉공원 등 주요 산책로 내 사업안내 및 의견수렴 현수막 게시: 2023. 3.8.~ 3.21.
- 1·2단계 공사현장 공사안내시설 및 현수막 게시: 2023. 8. 16.
- 민선8기 구정 인식 정책수요조사: 2023. 5. ~ 6.
 - ▶ 「응봉근린공원 무장애 친화숲길」 사업 효과에 대한 기대 : 도움된다 ⇒ 85.4%



공부·현수막·안내시설(2023.8.16.~8.21.까지)

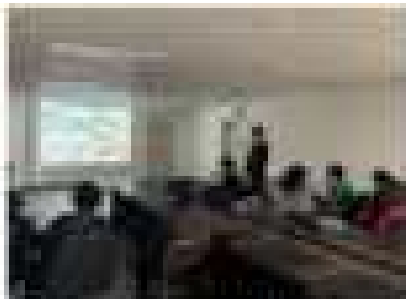

민간·주민설명회(2023.3.9.~3.21.까지)

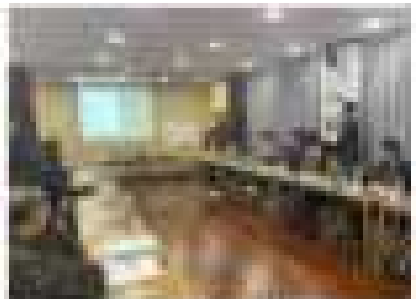

공부·주민설명회(2023.3.9.~3.21.까지)

연차별 추진목표 및 실적

단위사업(성과지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 무장애 친화숲길조성(km)	목표	-	3.39	1.75	0.38	-	61%
	실적	-	3.39	-	-	-	

연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계	5,950	2,900	3,050		
	국비	960		960		
	시비	640		640		
	구비	3,350	2,900	1,450		
	기타(민자)					
집행액	소계	2,547	88	2,459		
	국	564		564		
	시	377		377		
	구비	1,606	88	1,518		
	기타(민자)					

향후계획


- 2023. 7. ~ 2024. 12.: 무장애 친화숲길 공사 시행
 - 2023. 7. ~ 2024. 5. : 1·2단계(무학봉 ~ 버티고개)
 - 2024. 1. ~ 12. : 3단계(버티고개 ~ 반얀트리호텔)
- 2025. 1. ~ 12. : 남산연결로(반얀트리 ~ 남산) 조성

홍보계획

- 서울행정시스템 내 업무공지를 통한 사업 진행과정 알림
- 보도자료 배포, 블로그 및 SNS를 통한 사업홍보



조성사례(무학봉공원 무장애길-중구)

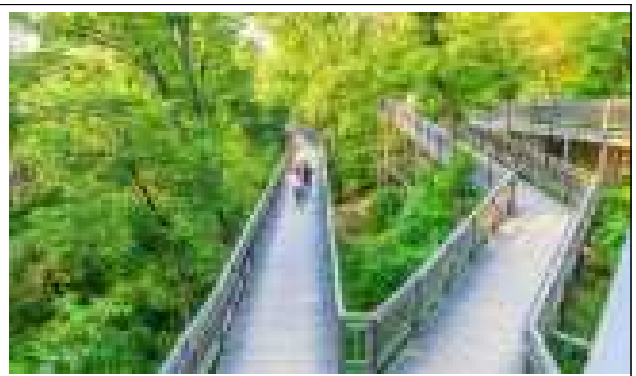

조성사례(신정산 자락길-양천구)



조감도(응봉친화숲길 전망포토존)



조성사례(백범광장-남산 녹지연결로)
