

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m<sup>2</sup>) · 부피(m<sup>3</sup>)]

| No. | 위치    | 석면건축자재 | 석면종류 및 함유량 | 면적(m <sup>2</sup> ) |
|-----|-------|--------|------------|---------------------|
| 1   | 2층 천장 | 텍스     | 백석면 3%     | 326.88              |
| 합계  |       |        |            | 326.88              |

첨부 2


5. 측정 결과

| 시료번호 | 측정 지점   | 측정 결과(f/cc) | 검출석면 |
|------|---------|-------------|------|
| #1   | 부지경계선   | 0.002       | -    |
| #2   | 부지경계선   | 0.001       | -    |
| #3   | 부지경계선   | 0.002       | -    |
| #4   | 부지경계선   | 0.001       | -    |
| #5   | 위생설비 입구 | 0.002       | -    |
| #6   | 음압기     | 0.003       | -    |
| #7   | 폐기물 반출구 | 0.002       | -    |

첨부 3

6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2017년 12월 9일

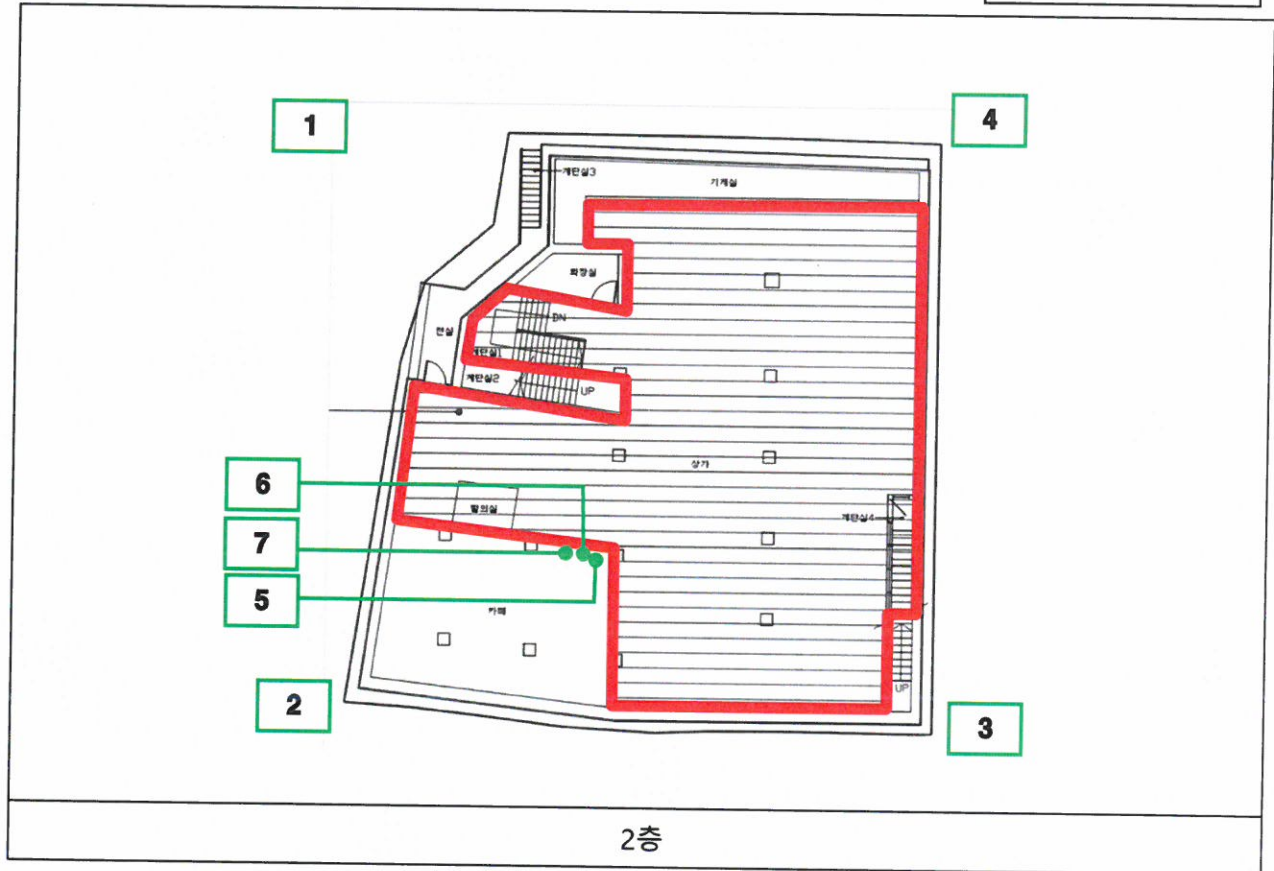

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m<sup>2</sup>) · 부피(m<sup>3</sup>)]

| No. | 위치      | 석면건축자재 | 석면종류 및 함유량 | 면적(m <sup>2</sup> ) |
|-----|---------|--------|------------|---------------------|
| 1   | 1층 중층 벽 | 밤라이트   | 백석면 5%     | 164.48              |
| 2   | 1층 천장   | 텍스     | 백석면 3%     | 103.85              |
| 합계  |         |        |            | 268.33              |

첨부 2

5. 측정 결과

| 시료번호 | 측정 지점   | 측정 결과(f/cc) | 검출석면 |
|------|---------|-------------|------|
| #1   | 부지경계선   | 0.001       | -    |
| #2   | 부지경계선   | 0.001       | -    |
| #3   | 부지경계선   | 0.001       | -    |
| #4   | 부지경계선   | 0.002       | -    |
| #5   | 위생설비 입구 | 0.003       | -    |
| #6   | 음압기     | 0.002       | -    |
| #7   | 위생설비 입구 | 0.002       | -    |
| #8   | 음압기     | 0.002       | -    |
| #9   | 폐기물 반출구 | 0.003       | -    |

