


석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 지층(폐기물상차)				
측정일 : 2018년 05월 07일			분석일 : 2018년 05월 07일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180507-C01	폐기물상차지점-1	0.001	기준미만	—
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

1. 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시야
2. 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
3. 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
4. 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

불임 2. 측정위치도 - 폐기물상차지점

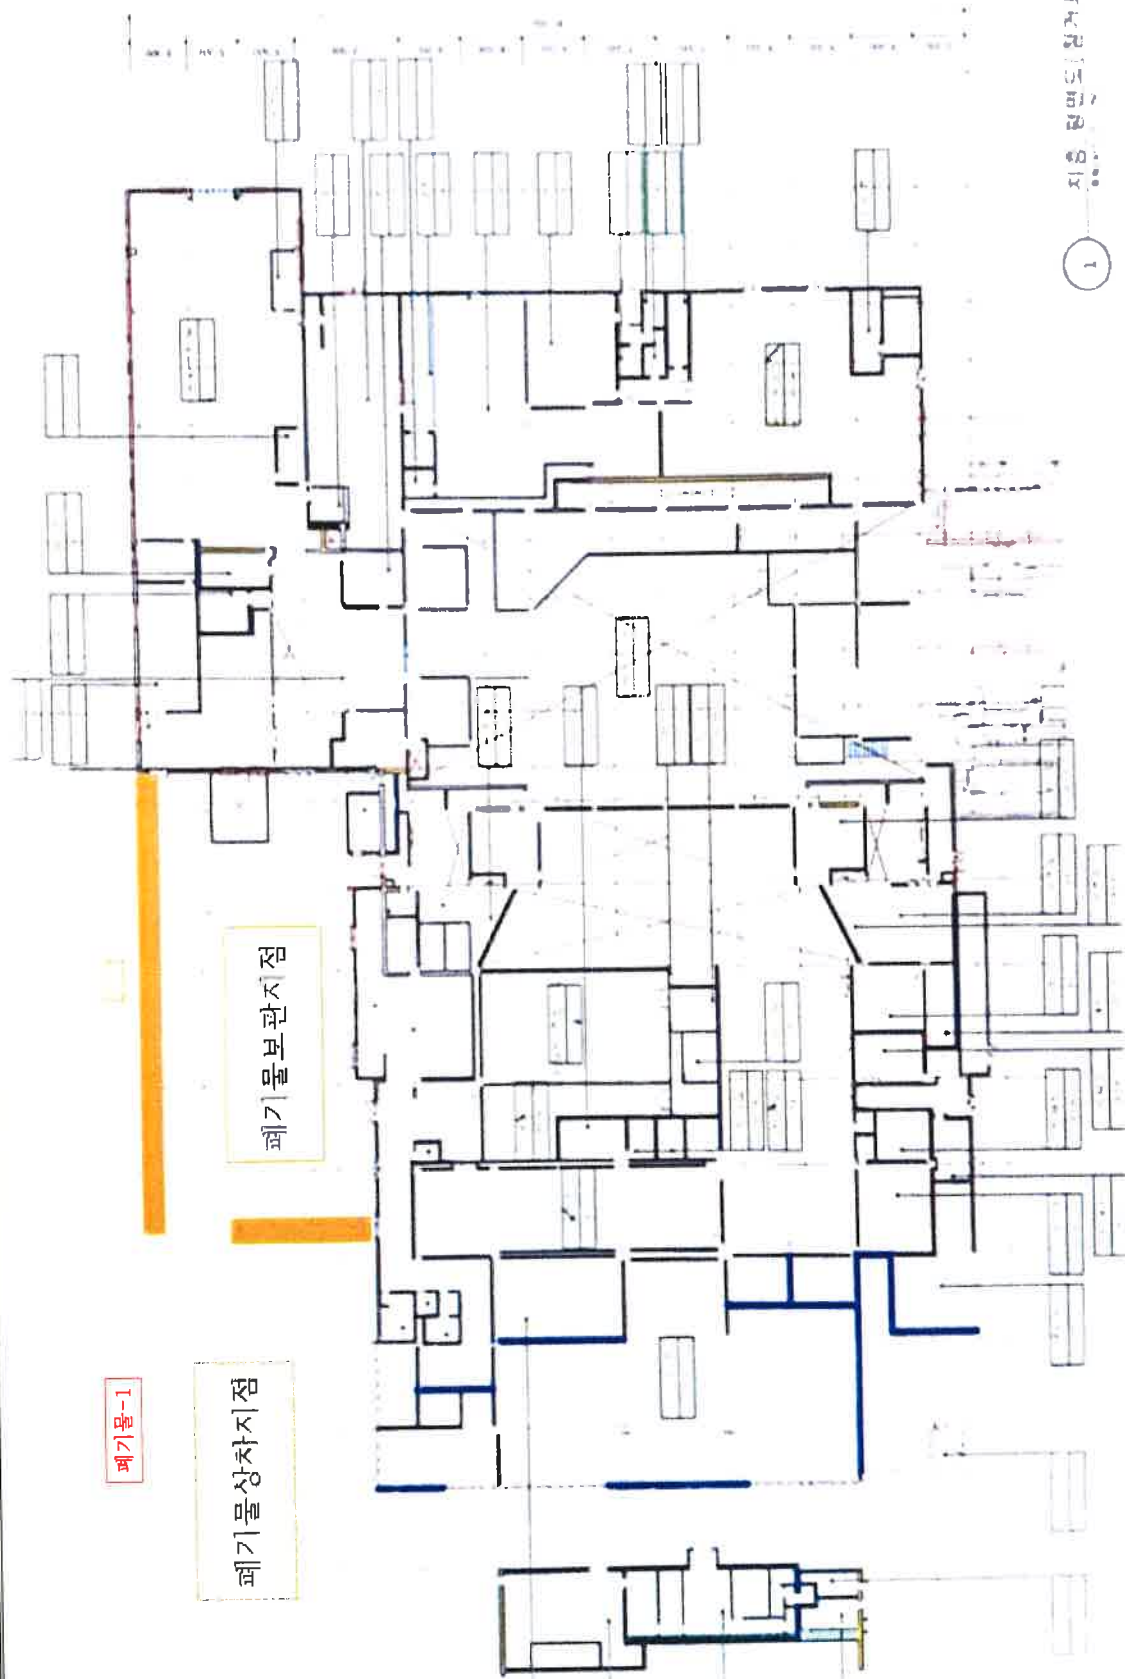


석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층				
측정일 : 2018년 05월 08일		분석일 : 2018년 05월 08일		
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180508-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	-
KE-180508-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	-
KE-180508-C03	부지경계선-3	0.002	기준미만	-
KE-180508-C04	부지경계선-4	0.001	기준미만	-
KE-180508-C05	위생설비-1	0.004	기준미만	-
KE-180508-C06	음압기배출구-1	0.003	기준미만	-
KE-180508-C07	음압기배출구-2	0.003	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51		분석자 : 고재우		

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시야
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층

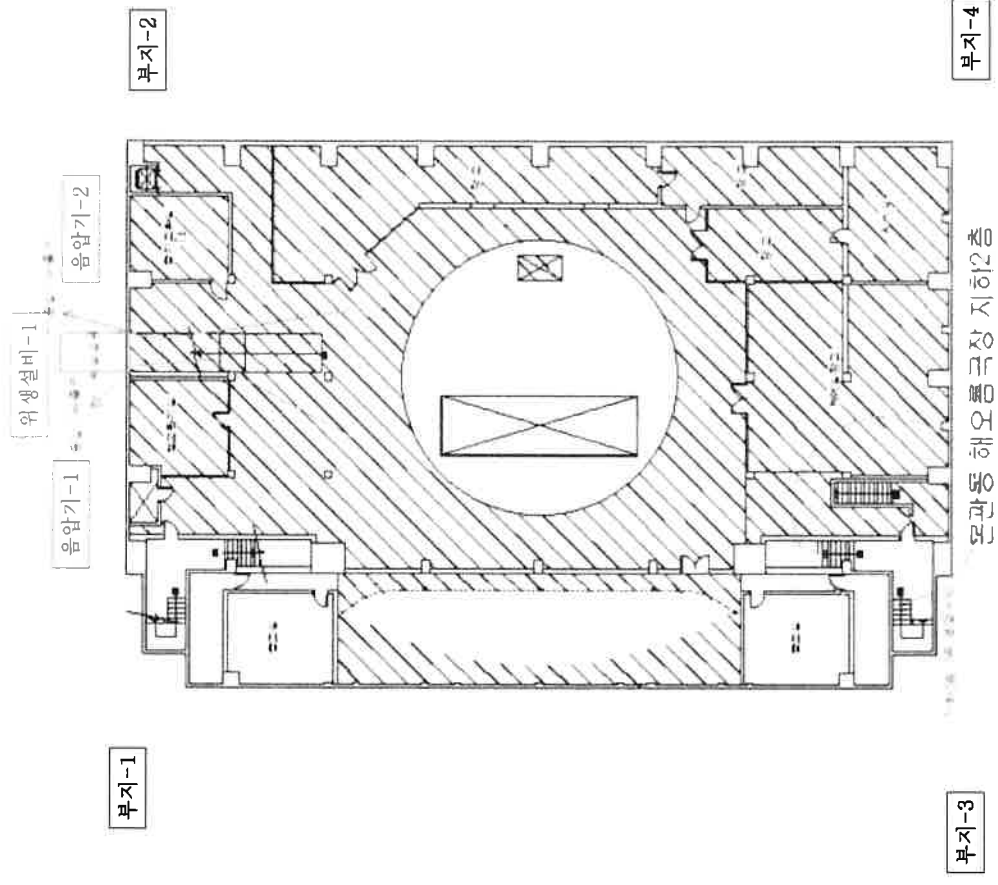


< 지하2층 >

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층				
측정일 : 2018년 05월 09일		분석일 : 2018년 05월 09일		
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180509-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	-
KE-180509-C02	부지경계선-2	0.002	기준미만	-
KE-180509-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	-
KE-180509-C04	부지경계선-4	0.002	기준미만	-
KE-180509-C05	위생설비-1	0.002	기준미만	-
KE-180509-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	-
KE-180509-C07	음압기배출구-2	0.003	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51		분석자 : 고재우		

- 1. 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- 2. 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- 3. 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 4. 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층

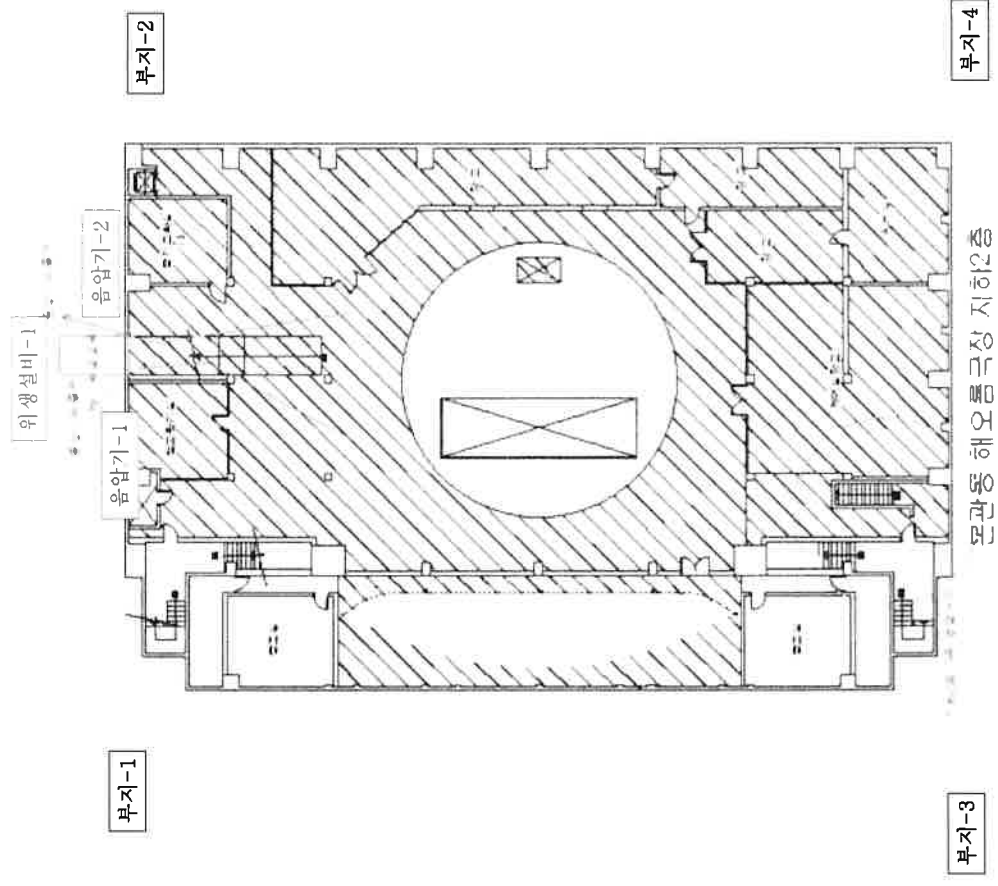


< 지하2층 >

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층				
측정일 : 2018년 05월 10일			분석일 : 2018년 05월 10일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180510-C01	부지경계선-1	0.002	기준미만	-
KE-180510-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	-
KE-180510-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	-
KE-180510-C04	부지경계선-4	0.001	기준미만	-
KE-180510-C05	위생설비-1	0.003	기준미만	-
KE-180510-C06	음압기배출구-1	0.004	기준미만	-
KE-180510-C07	음압기배출구-2	0.002	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ※ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/cm³, 검출한계 : 7개/100시야
- ※ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ※ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ※ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하2층, 지하3층

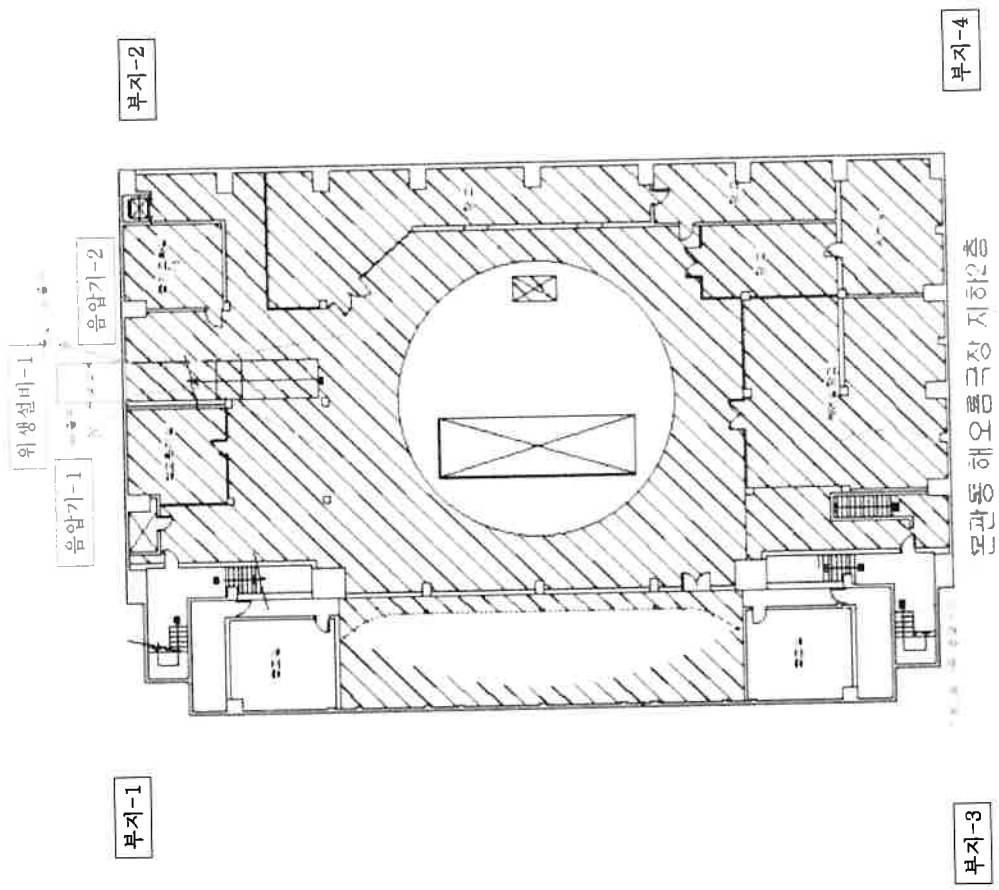

< 지하2층 >
