

4. 측정결과(첨부)


측정결과 (2018년 5월 26일 , 2018년 5월 27일)

일시	2018년 5월 26일				
측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부	
부지경계선-1	190	13	0.002	미만	
부지경계선-2	190	13	0.001	미만	
부지경계선-3	190		0.001	미만	
부지경계선-4	190	13	0.002	미만	
위생설비입구	60	13	0.004	미만	
음압기배출구-1	60	13	0.003	미만	
음압기배출구-2	60	13	0.004	미만	
공시료	0	0	0	0	
일시	2018년 5월 27일				
측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부	
부지경계선-1	190	13	0.001	미만	
부지경계선-2	190	13	0.002	미만	
부지경계선-3	190	13	0.001	미만	
부지경계선-4	190	13	0.002	미만	
위생설비입구-1	60	13	0.006	미만	
위생설비입구-2	60	13	0.002	미만	
음압기배출구-1	60	13	0.004	미만	
음압기배출구-2	60	13	0.004	미만	
폐기물반출구	60	13	0.003	미만	
공시료	0	0	0	0	

5. 농도측정지도

2층

부지경계선-3

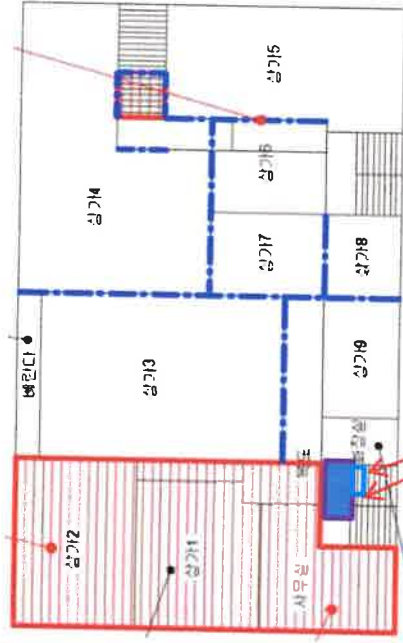

폐기물배출구
위생시설입구-1

부지경계선-1

1층

부지경계선-4



폐기물보관지점

음압기배출구-1

부지경계선-2

범례

	부지경계선
	폐기물반출구
	위생설비
	음압기
	측정지점
	공사구역

측정일

2018년 5월 27일

2일차공사구역

- * 부지경계선: 4개 이상, 높이 1.2~1.5m
- * 폐기물반출구: 전수(1개 이상), 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2m~1.5m
- * 위생설비 입구: 전수(1개 이상), 위생설비 입구, 높이 1.2m~1.5m, 거리 1m이내
- * 음압기: 전수(1개 이상), 음압기 공기 배출구 0.3m~1m이내
- * 작업장 주변- 실내: 1개 이상, 작업장 주변 높이 1.2m~1.5m(건축물의 일부 공간에서 석면해체 제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함, 사용자가 없는 경우 제외)

실외: 1개 이상, 해당 건축물 외부 높이 1.2m~1.5m[대상 건축물 주변 5m이내(부지경계선이 대상 건축물 5m이내에 위치시 제외, 음압기 설치시 제외)]

[별첨] 측정사진

[illegible]
