

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과


측정일시	08월 20일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	6	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	7	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	8	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	9	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	10	폐기물반출구	0.01	0.004	검출한계미만

측정일시	08월 21일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	11	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	12	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	13	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	14	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	15	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	16	폐기물반출구	0.01	0.002	검출한계미만
	17	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	18	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만

■ 석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

측정일시	08월 28일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	19	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	20	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	21	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	22	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	23	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	24	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	25	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	26	음압기	0.01	0.003	검출한계미만
	27	폐기물반출구	0.01	0.004	검출한계미만


2. 측정 지점 위치(도식도)-1. (8월 20일)

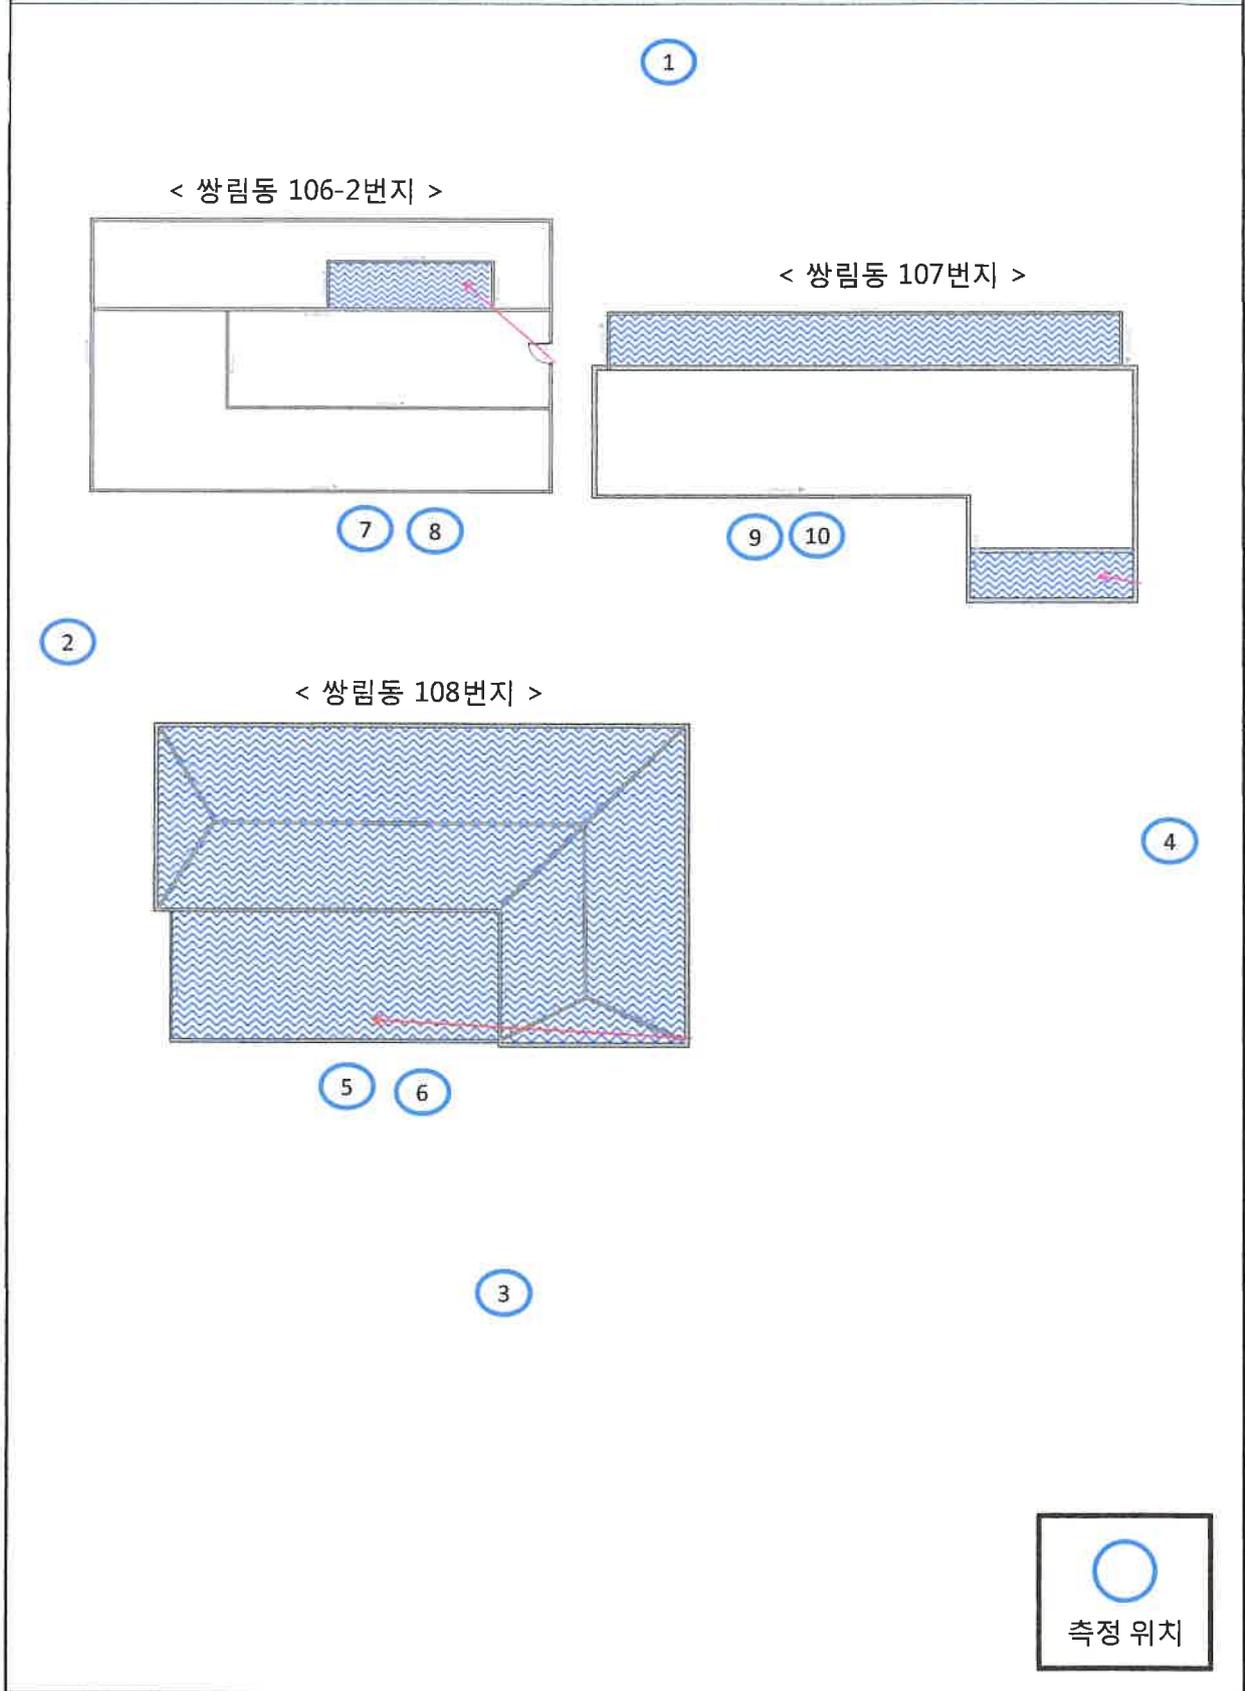

2. 측정 지점 위치(도식도)-2. (8월 21일)

11

< 쌍림동 109-2번지 >



16




15

12

14

< 쌍림동 111-2번지 >

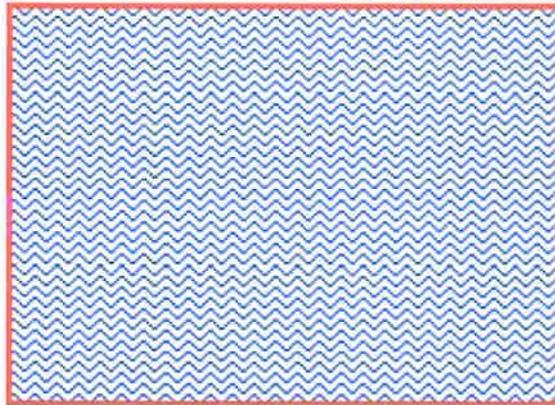

17


18

13



2. 측정 지점 위치(도식도)-3. (8월 28일)

< 쌍림동 111-3번지 >

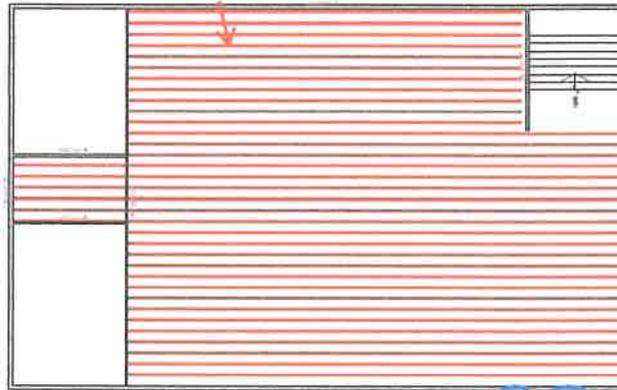


< 지하1층 >

25 26

27

19

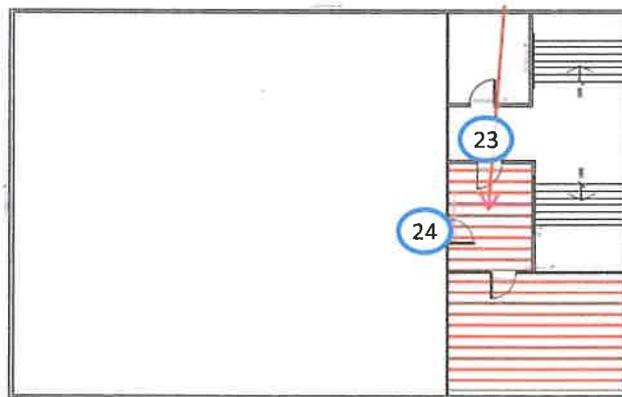

< 지상1층 >

20

22

24

23

21

