

16. 대현산 배수지공원 이용 활성화

관리번호	5-16	임지구분	임기내	사업주체	중구	신규여부	신규
사업기간	중기	지역범위	중구 전체		사업예산	9,500백만원	
작성자	공원녹지과장 : 홍순철 ☎8244 도시숲팀장 : 김일호 ☎5871 담당 : 김준성 ☎5872						

무학봉공원을 시점으로 응봉공원을 통과하여 남산까지 연결하는 무장애 숲길을 조성하여 도시민이 실생활에서 쉽게 접근할 수 있는 숲 공간을 제공하는 등 산림문화·휴양서비스를 확대하고자 함

□ 정책개요

- 위 치 : 무학봉공원 ~ 응봉공원 ~ 남산
- 규 모 : 5.52km
 - 안내체계 정비 구간 : 무학봉공원 ~ 동산초등학교(1.49km)
 - 무장애 숲길 구간 : 동산초등학교 ~ 반얀트리호텔(3.65km)
 - 남산 연결로 구간 : 반얀트리호텔 ~ 남산(0.38km)
- 기 간 : 2022. 5. ~ 2025. 12.
 - 1단계(안내체계 정비 1.49km, 무장애 숲길 1.9km : 동산초~서울방송고) : '23.1.~12.
 - 2단계(무장애 숲길 1.75km : 서울방송고~반얀트리호텔) : '24.1.~12.
 - 3단계(남산연결로 0.38km : 반얀트리호텔~남산) : '25.1.~12.
- 소요예산 : 9,500백만원(무장애 숲길 조성 67억원, 남산연결로 28억원)
 - * 무장애 숲길 조성비 45억원 확보(국비 9.6억원, 시비 6.4억원, 특교세 16억원, 특교금 13억원)
- 내 용 : 무장애 데크로드 조성, 산책로 정비, 남산연결로 설치 등

□ 추진실적

- 2022. 5. 6. : '22년 상반기 특별교부세(6억원) 교부
- 2022. 7. 12. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2022. 10. 13. : 녹색자금 공모사업 선정(16억원)
- 2022. 10. 26. : '22년 하반기 특별교부세(10억원) 교부
- 2022. 11. 4. : 계획(안) 구청장 보고
- 2022. 12. 22. : '22년 하반기 특별조정교부금(13억원) 교부

추진계획

- 2023. 1. ~ 2. : 주민설명회
- 2023. 2. ~ 3. : 계약심사 등 사전절차 이행, 공사발주
- 2023. 4. ~ 2024. 12. : 무장애 숲길(자락길) 공사 시행
 - 2023. 4. ~ 12. : 안내체계장비(1.49km), 동산초교~서울방송고교(1.9km)
 - 2024. 1. ~ 12. : 서울방송고교~반얀트리호텔(1.75km)
- 2025. 1. ~ 12. : 남산연결로 조성 등

홍보방안

- 시 기 : 연차별('23년~'25년) 사업진행 시점
- 대 상 : 중구민, 중구 소재 직장인 등
- 방 법
 - 대 내 : 서울행정시스템 내 업무공지를 통한 진행과정 알림
 - 대 외
 - ▶ 온 라 인 : 홈페이지, 블로그 및 온라인플랫폼(SNS)을 통한 진행사항 안내
 - ▶ 오프라인 : 찾아가는 주민설명회(약수, 다산동, 성동주민 등), 보도자료, 중구광장, 현수막, 팝업형 배너설치 등

기대효과

- 보행약자·남녀노소 누구나 편하고 안전하게 공원을 이용할 수 있는 힐링공간 제공
- 중구 동부권역 주민들이 도보로 응봉공원을 거쳐 남산까지 접근할 수 있는 생활권 숲길 조성으로 산림서비스 제공에 기여

공약달성 확인지표


(단위:km)

단위사업(확인지표)	2022	2023	2024	2025	2026
1. 숲길 조성	-	3.39	1.75	0.38	

연차별 소요예산

(단위:백만원)

구 분	연 도 별 소 요 예 산					
	총 계	2022	2023	2024	2025	2026
계	9,500	2,900	1,600	2,200	2,800	
국 비	960		960			
시 비	5,640		640	2,200	2,800	
구 비	2,900	2,900				
기타(민자)						

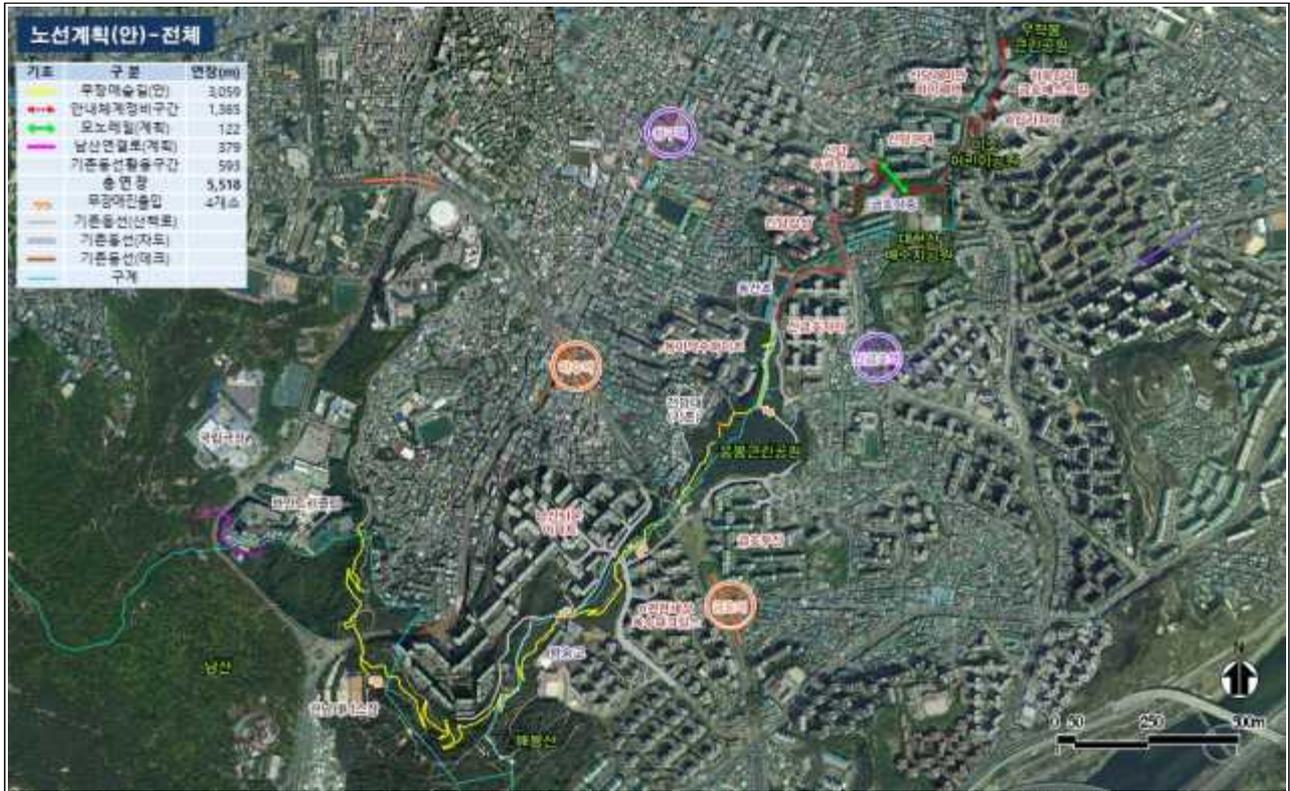

무장애 숲길 사례사진



남산연결로 조감도

